



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR WS/14/120 - No
 ADRES INSTALLATIE: Danstraat 105
Bertem (verdieping)
 EIGENAAR :
 Adres :
 OPDRACHTGEVER : MB Entree
Leijde
 Adres :
 INSTALLATEUR : "
 Adres :
 BTW of IK :

DISTRIBUTIEBEHEERDER:
 Meter nr. : 61657 298
 Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 10/9/14 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: parkeergarage
 Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
 Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
 Aansluiting: Spanning 3x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 30mA
 Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x16 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
 Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TN - TT
 Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 14 ; Spreidingsweerstand : 1243 Ohm ; Alg. Isolatie-niveau: > 1 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 30mA 4P
- A E en G
- DS 40A 30mA 4P
- - H E en N

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
 en de technische procedure(s) TPR-E12 -
 De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen
 De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Keuker en badkamer zijn nog op te werken

VISUM VAN DE VERDELER


RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting ~~was~~ werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/9/2039
 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
 De installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
 ATK v.z.w
 2820 BONHEIDEN
 Wim STERCK
 agent-onderzoeker

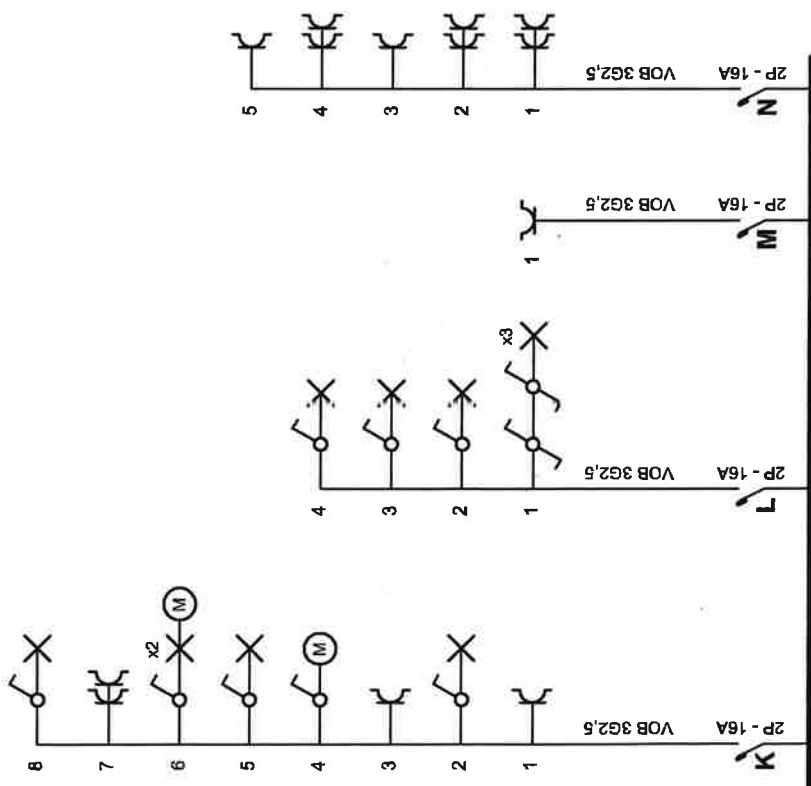


CONTROLORGANISME
 VZW
 H. VAN
 2822 BONHEIDEN
 WILHELMUS
 agent-onderzoeker

[Handwritten signature]

<p>Plaats van de elektrische installatie MB entreprise dorpsstraat 105 Bertern Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0453.843.994</p>	<p>Installateur MB entreprise Grensstraat 16 3061 Leefdaal Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0453.843.994</p>	<p>p. 2/5 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz</p>
---	---	--


Schema's getekend door: VTI Aaist

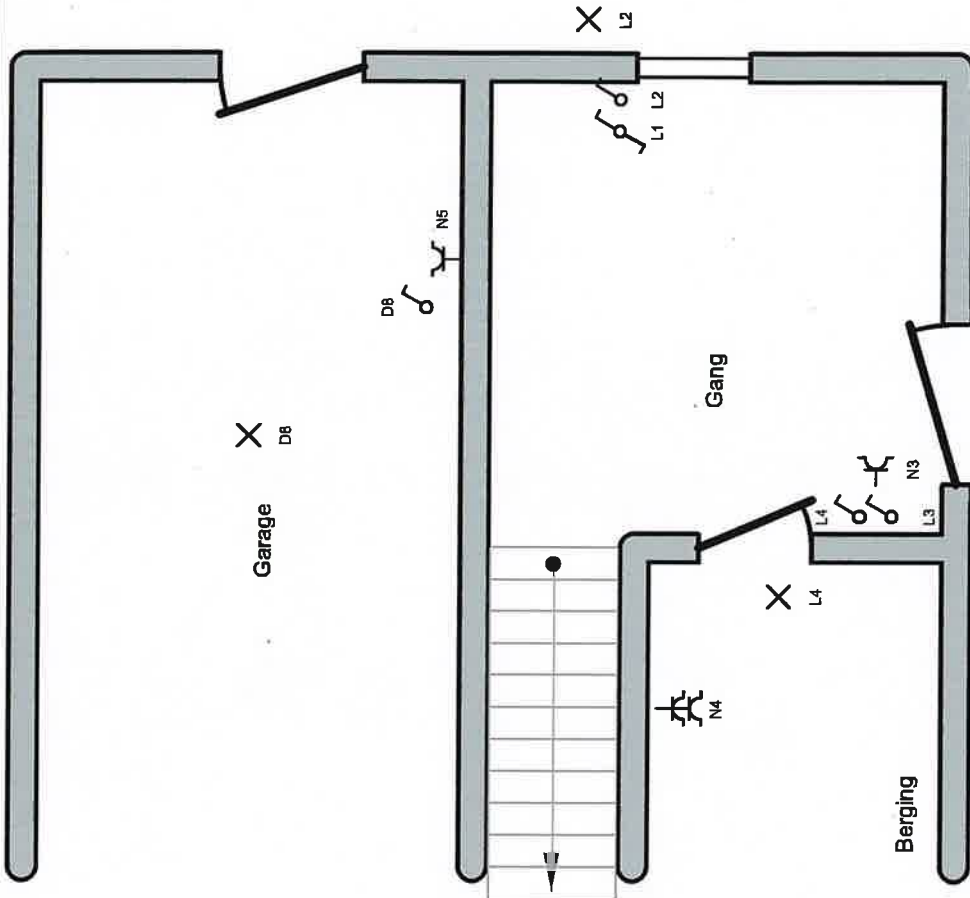

CONTROLEORGANISATIE
 RIVM
 2824 BOVENDEIJEN
 WITTE WERCKX
 agent voor de provincie

[Handwritten signature]

Plaats van de elektrische installatie MB entreprijs dorpsstraat 105 Bertern Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0453.843.994		Installateur MB entreprijs Grensstraat 16 3061 Leefdaal Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0453.843.994	
Schema's getekend door: VTI Aalet		p. 5/5 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz	

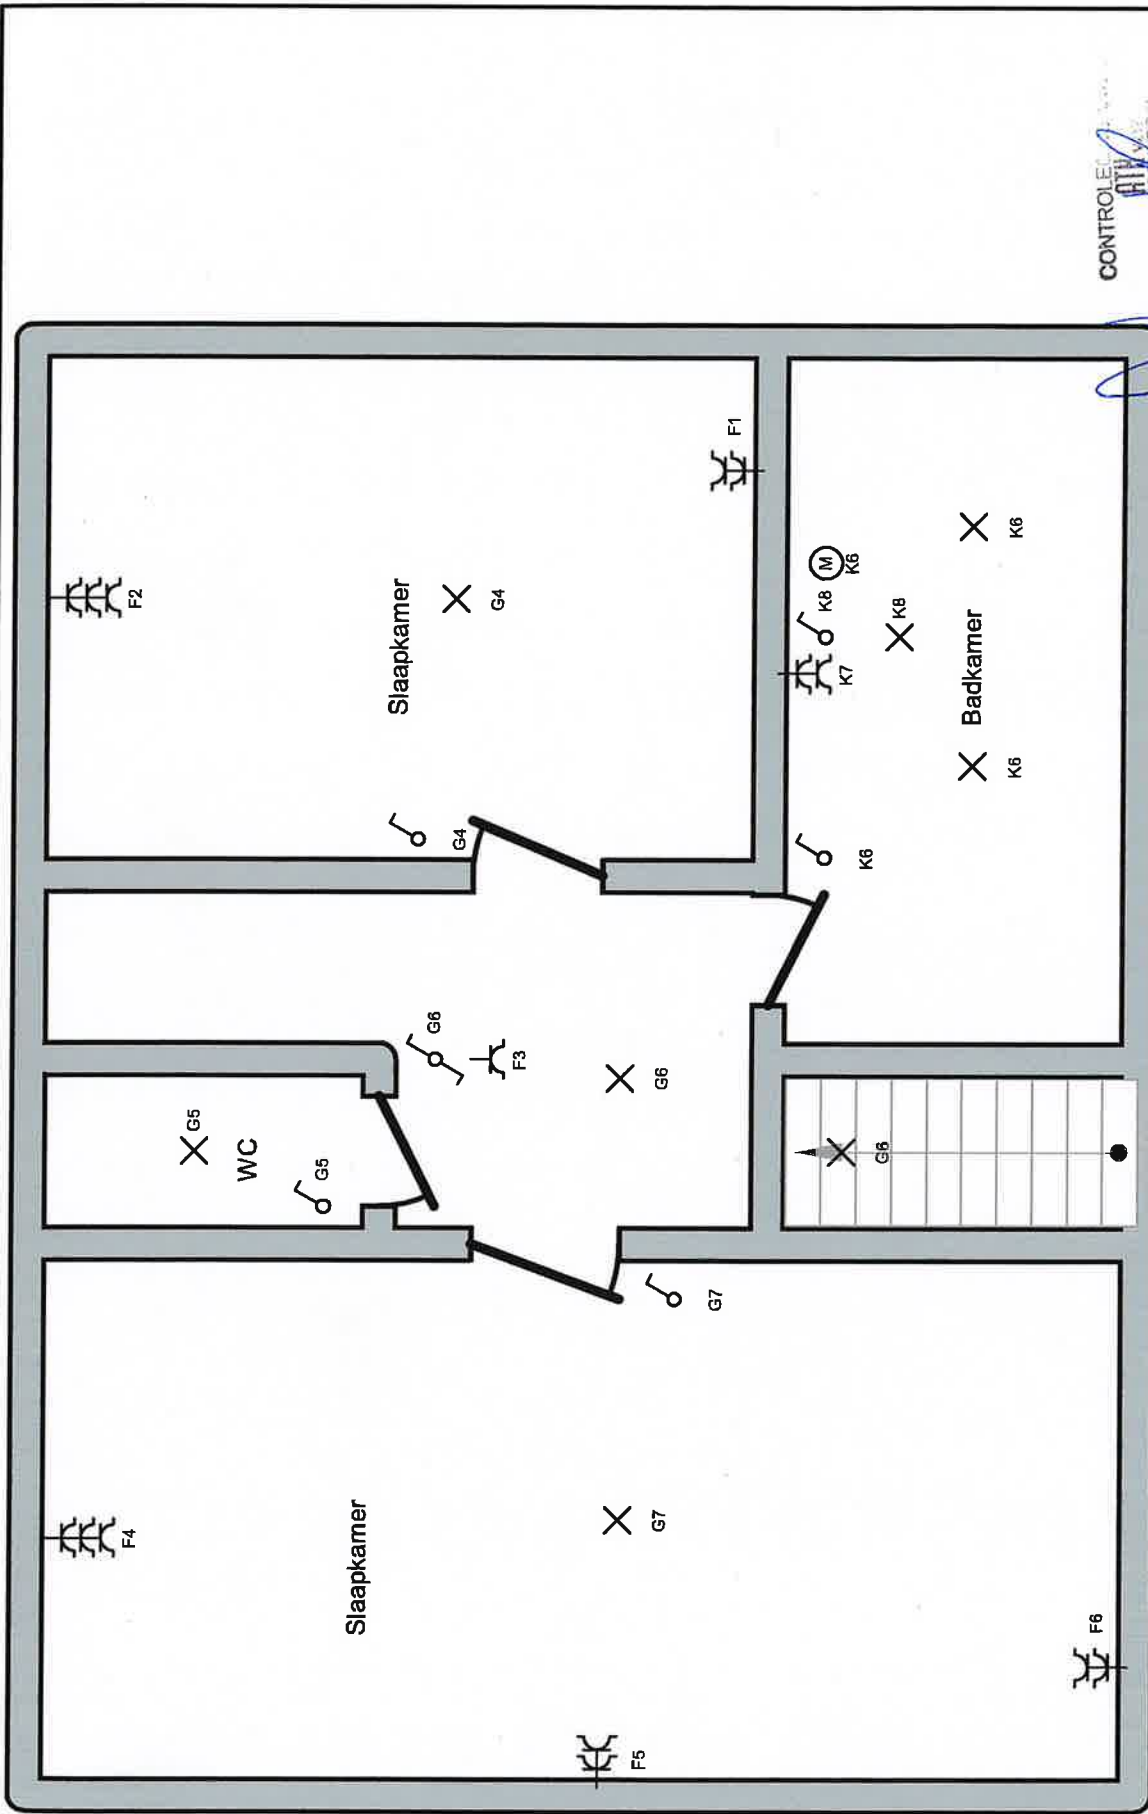

CONTROLEERD
 2820 BILVERDIEN
 WILM STERCKX
 agent
 Vandenbergh

[Handwritten signature]

2e Verdieping

<p>P. 4/5 Situatieschema 3 x 230V ~ 50Hz</p>	<p>Installateur MB entreprise Grensstraat 16 3061 Leeftaal Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0453.843.994</p>	<p>Plaats van de elektrische installatie MB entreprise dorpsstraat 105 Bertem Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 0453.843.994</p>
<p>Schema's getekend door: VTI Aalst</p>		

