



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P036267080



N° 058369

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

6

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Delbaen</u>	Naam, voornaam : <u>DERBOVEN</u>	
Ident. Kaart nr. :	Adres : <u>TER VOORT 61</u>	
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>2260 WESTERLO</u>	
	Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding ☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☒ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid ☒ Huishoudelijke werkeenheid ☒ Gemeenschappelijke delen ☒ Werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 276 : verzwarende	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>11530511</u>	meterstand dag : <u>5748</u>	nacht :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☐ kWh excl. nacht meter :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V		Type aardelektrode :
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100		☐ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>EXUN</u>		☒ BESMAW
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>50</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>9</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>22.5</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>72</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☐ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	☒ Nihil
	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☒ voldoet niet	aan het AREI.
☒ De bestaande installatie	☒ voldoet	☒ voldoet niet	aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : BERGHEMAN Agent nr. : 3626 Datum : 16/06/2014


Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 3 ☒ Einddraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór
16/10/2014 (*)
door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal - Handtekening


04731960330

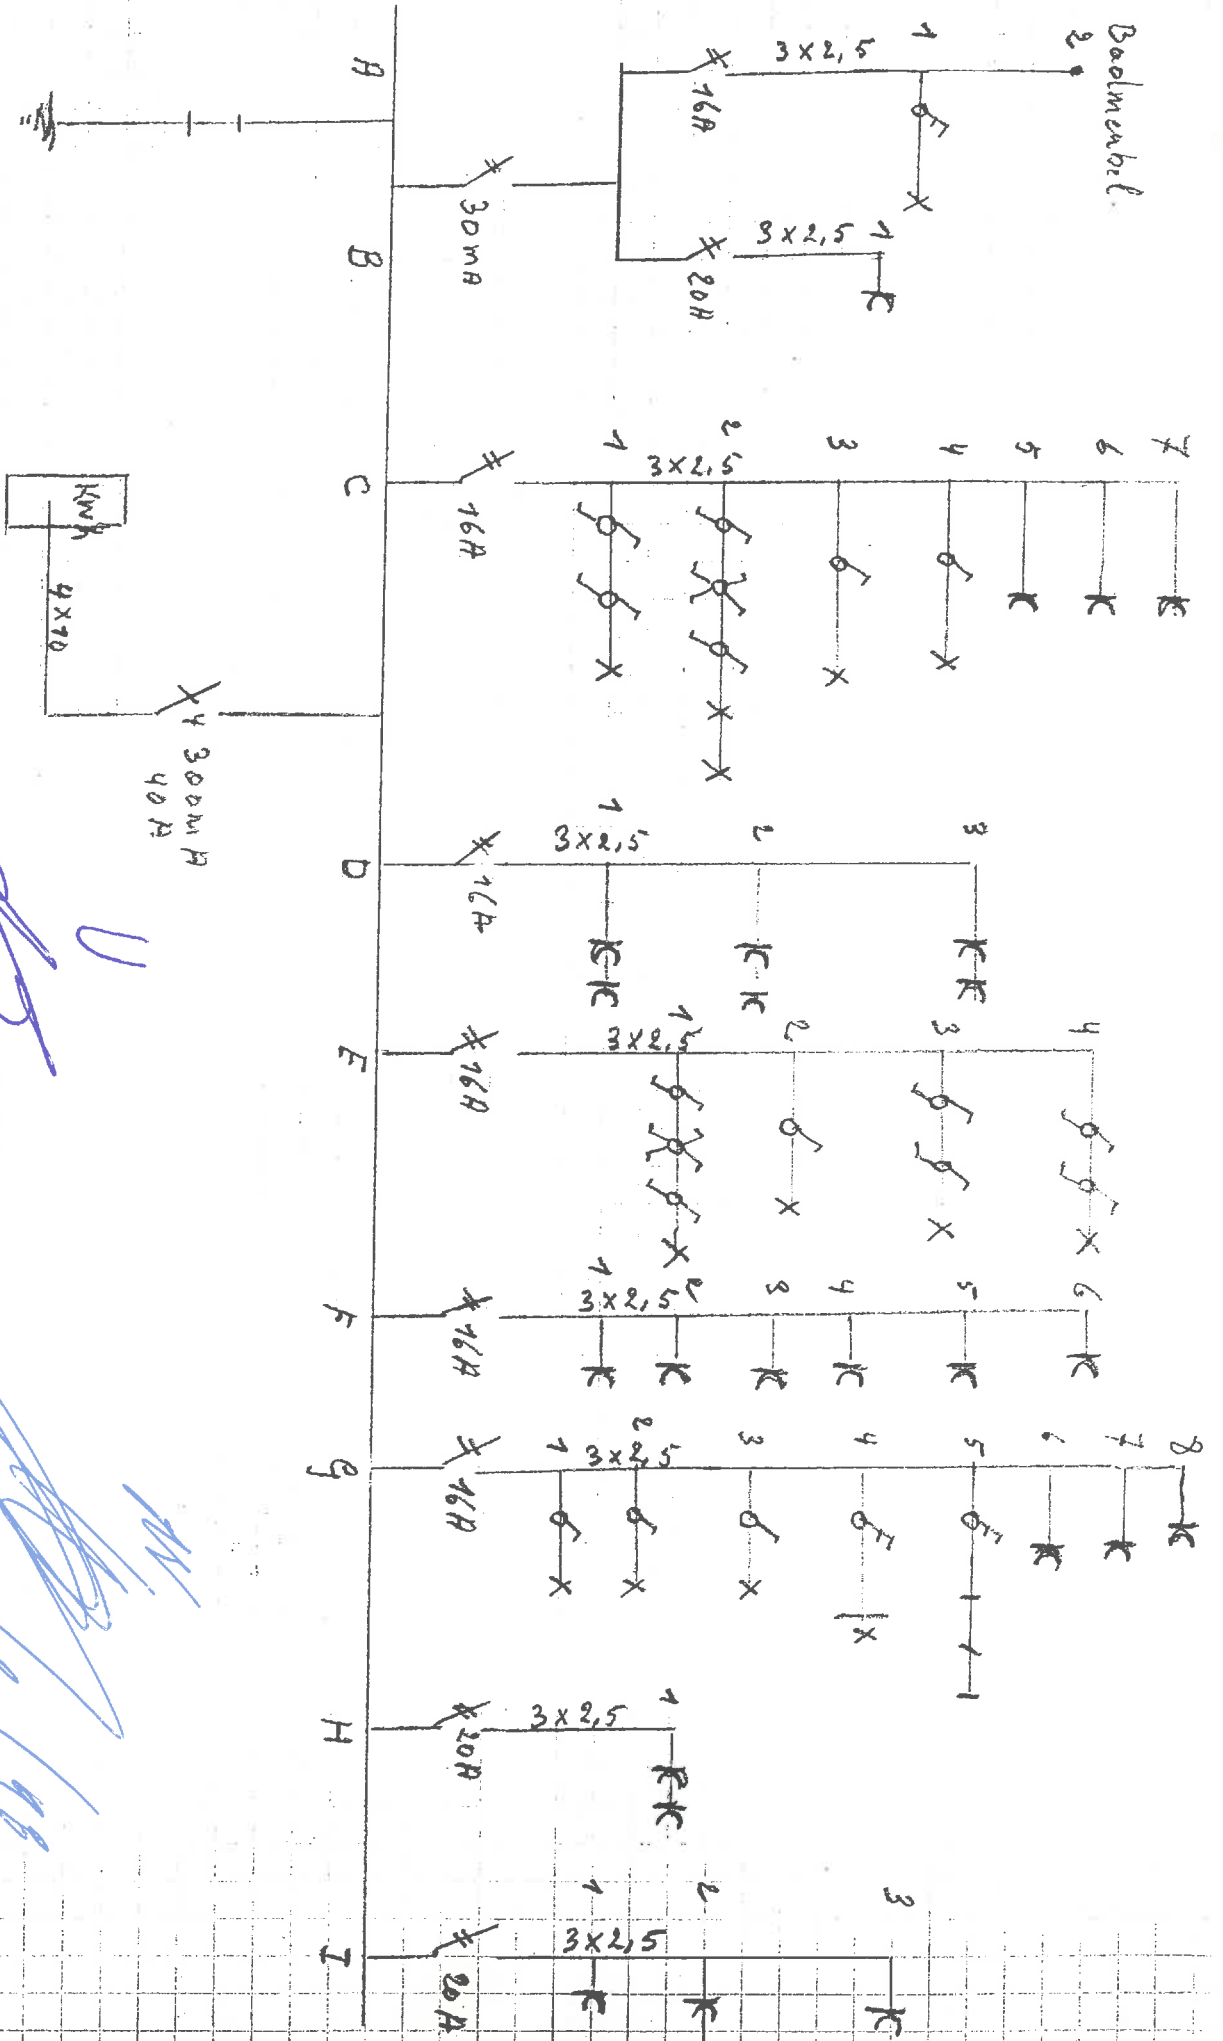

U
Nehlsen

11/1/08
11/1/08

De eigenaar

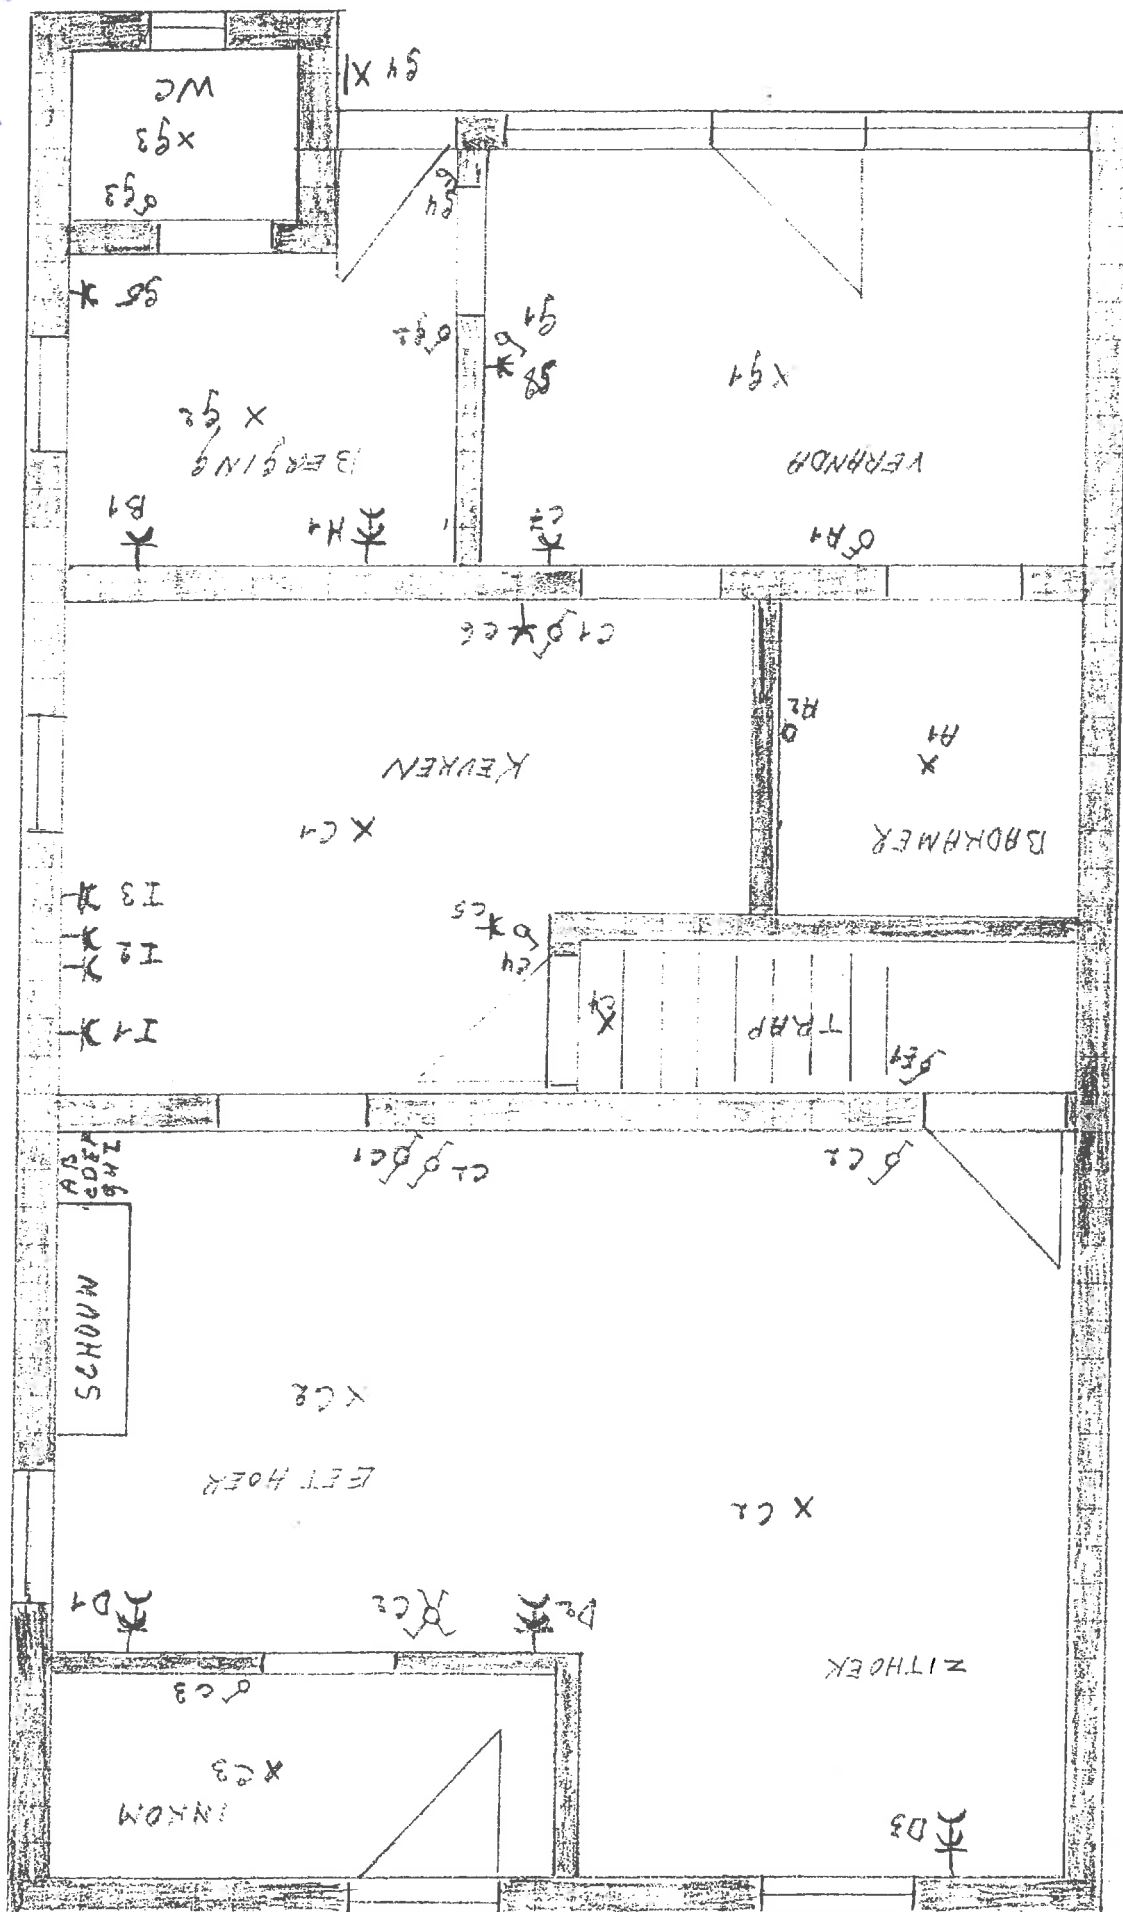

SLAAPKAMER 2

SLAAPKAMER 1

F6

K F3

F5

K F2

F4


F1

WC

TRAP

NACHTHAL

W
n/v
10/10/98

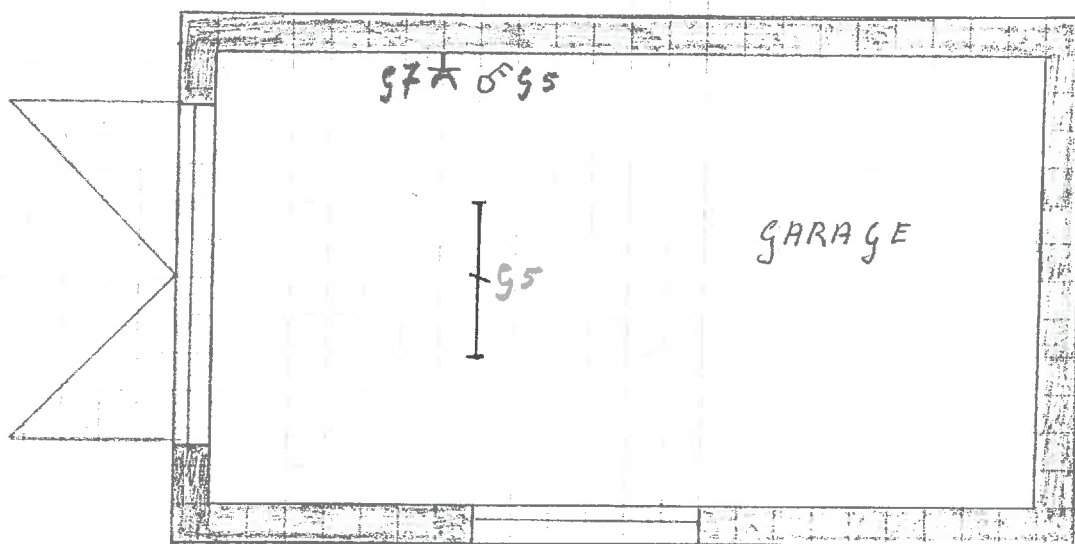

21/04/2020
