

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221202011015 Datum onderzoek: 02/12/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: La vie en roos
 Plaats van onderzoek: Molenstraat 35, 9900 Eeklo (België)
 Eig./Uitb./Beh.: Pascal Jonckheere - Molenstraat 35, 9900 Eeklo (België)
 Uitvoerder: Frederiek Mortier - Stationsstraat 55, 9990 Maldegem (België)
 Bedrijf: Electro Frederiek BVBA Ond nr : BE0824404681
 Type lokalen: Wooneenheid
 Doel onderzoek: 6.4 - PV-panelen - Gelijkvormigheid/indienststelling volgens AREI Boek 1 - KB 08/09/2019
 Installatie van: voor 1981 1981-2020 na 1-6-2020 Herkeuring op : 02/12/2047

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN:
 DNB: Imewo
 Nominale spanning: 230V mono
 Hoofdbeveiliging: 40A
 Voedingsleiding: 2 x 10 mm² EXVB
 Elektrode type: Pen
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: +1
 Waarde diff. inr: 300mA 63A - 30mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK
 Diff. testknop: OK
 Diff. foutlus: OK
 Bescherming RA/OA: OK
 staat vast elektrisch materieel: OK
 R isolatie: 1.24 MOhm
 R aarde: 12.9 Ohm
 Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Dit onderzoek behelst enkel de PV-installatie.

Aantal panelen: 10 x 400 Wp

Aantal omvormers: 1

- Type: Solis S6-GR1P3K-M
- s/n: 1801050226010139
- Pac max: 3,3 kVA

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De PV-installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 08/09/2019. Het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 02/12/2047 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221202011015 Datum onderzoek: 02/12/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek. Bij onbereikbaarheid van de metalen structuur zonnepanelen kan bijkomende equipotentiale verbinding niet worden gemeten. (7.112.2)


Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Nathan De Kegel**

Datum vrijgave: 02/12/2022

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221202011015 Datum onderzoek: 02/12/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

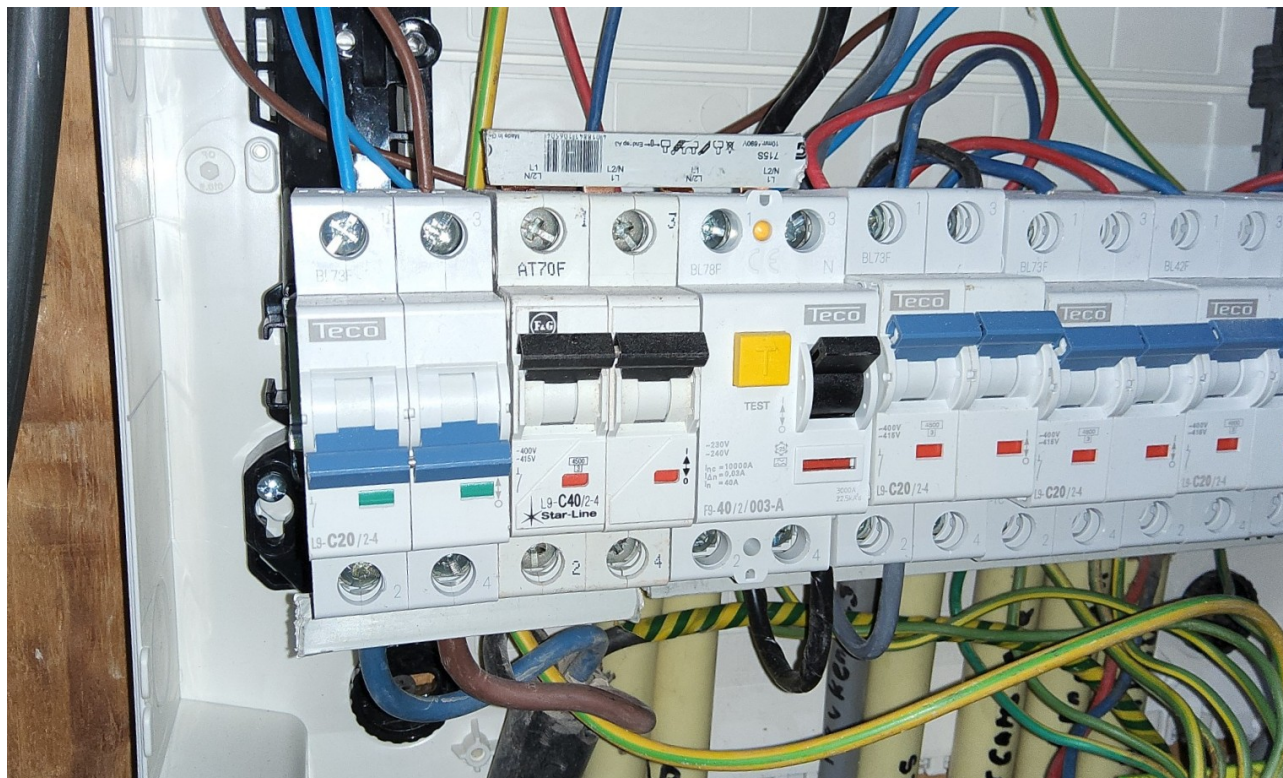

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20221202011015 Datum onderzoek: 02/12/2022 Agent: Nathan De Kegel volgens procedure TP01b

