



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 31/01/2025 Inspecteur: Michel Mergan Mentor: Installateur: Ecotherm
ID-label: B.T.W. nr.: Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19481242

Datum verslag: 10/02/2025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1809744

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 26
Busnummer
Postcode 9900
Gemeente EEKLO
Land België

Eigenaar

Naam [REDACTED]
Straatnaam Kerkstraat
Huisnummer 26
Busnummer
Postcode 9900
Gemeente EEKLO
Land België

Installateur


Naam Ecotherm
BTW nr. BE
Telefoonnummer +
E-mail +

Type : woning

EAN : 541448820042830410

Teller Nr.: : 1SAG1100668571

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 20

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 2,04 MΩ

RE: 26.5 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Int	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40	A/F	22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40	G/L	22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40	M/R	22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.
- nota/note 37 Toestellen niet geplaatst op moment van controle. Maximaal vermogen kon niet worden nagekeken ter bepaling van het gebruik van de kring (Boek 1 onderafdeling 5.2.1.2.)
- nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.
- nota/note 9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 31/1/2050
 - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..


Aantal bijlage(n): 10
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
Inspectietijd: van 08:54 tot 09:40


Morgan Michel - ACEG


© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 31/1/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

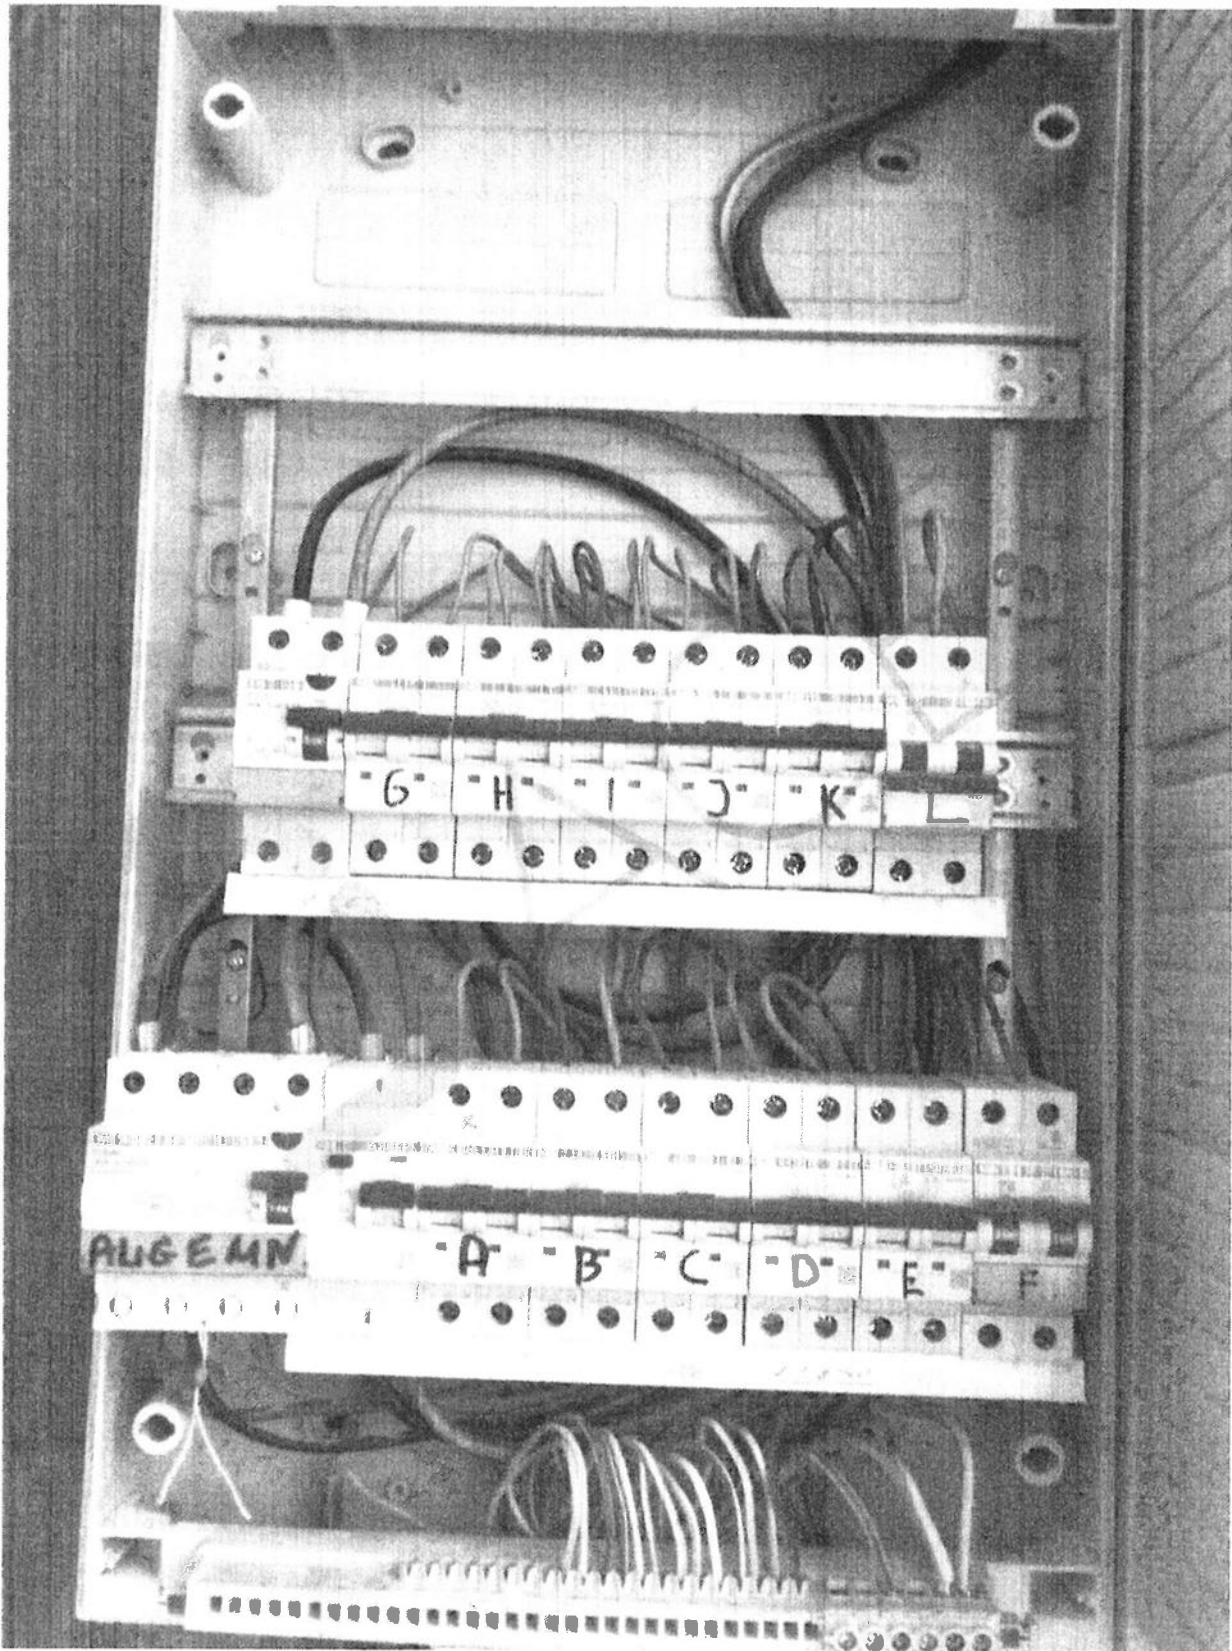


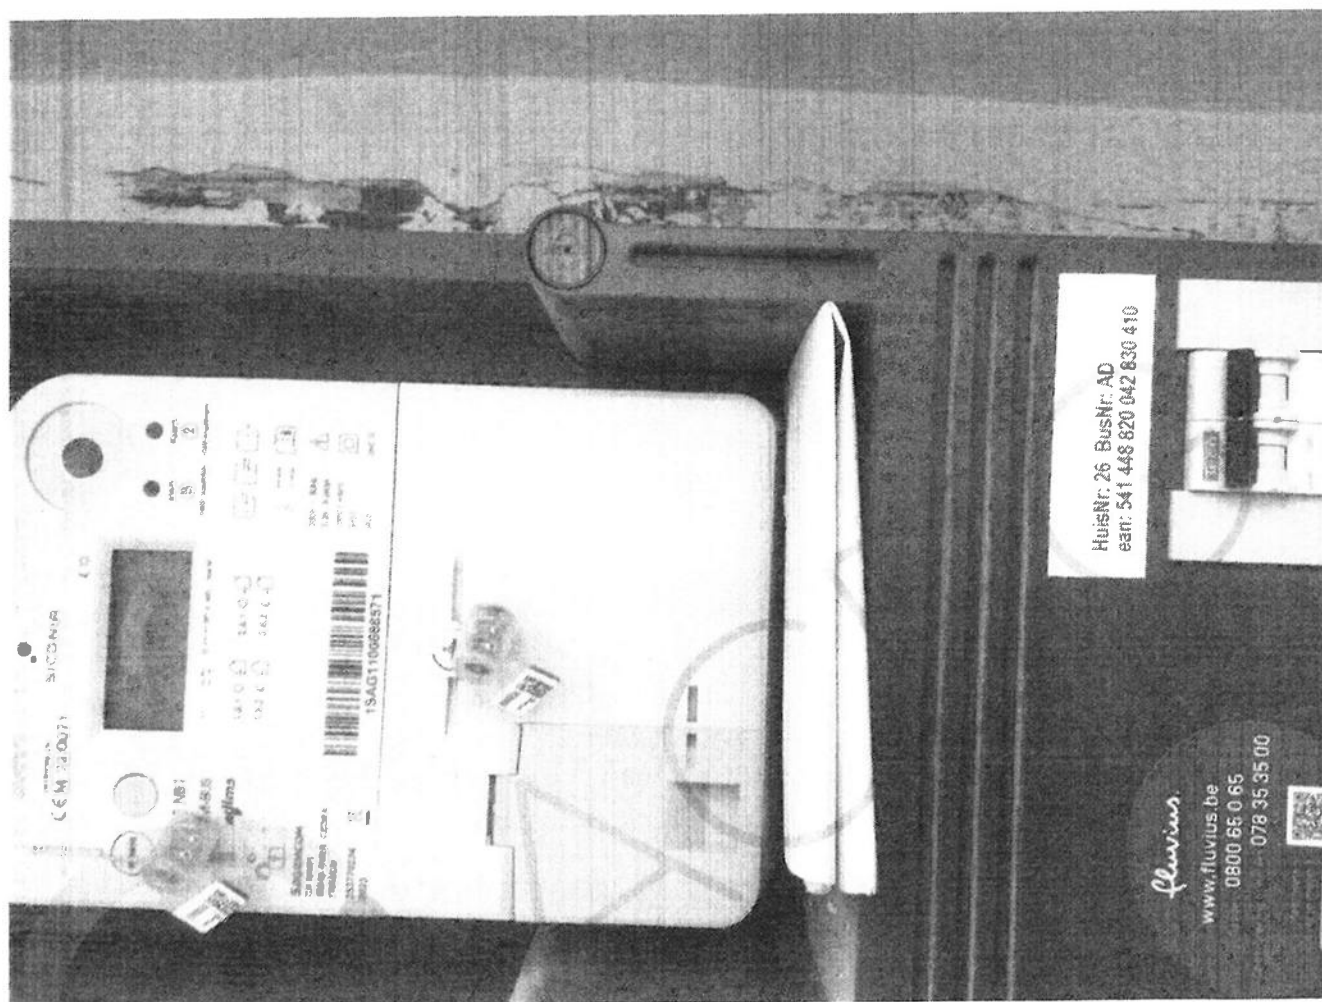

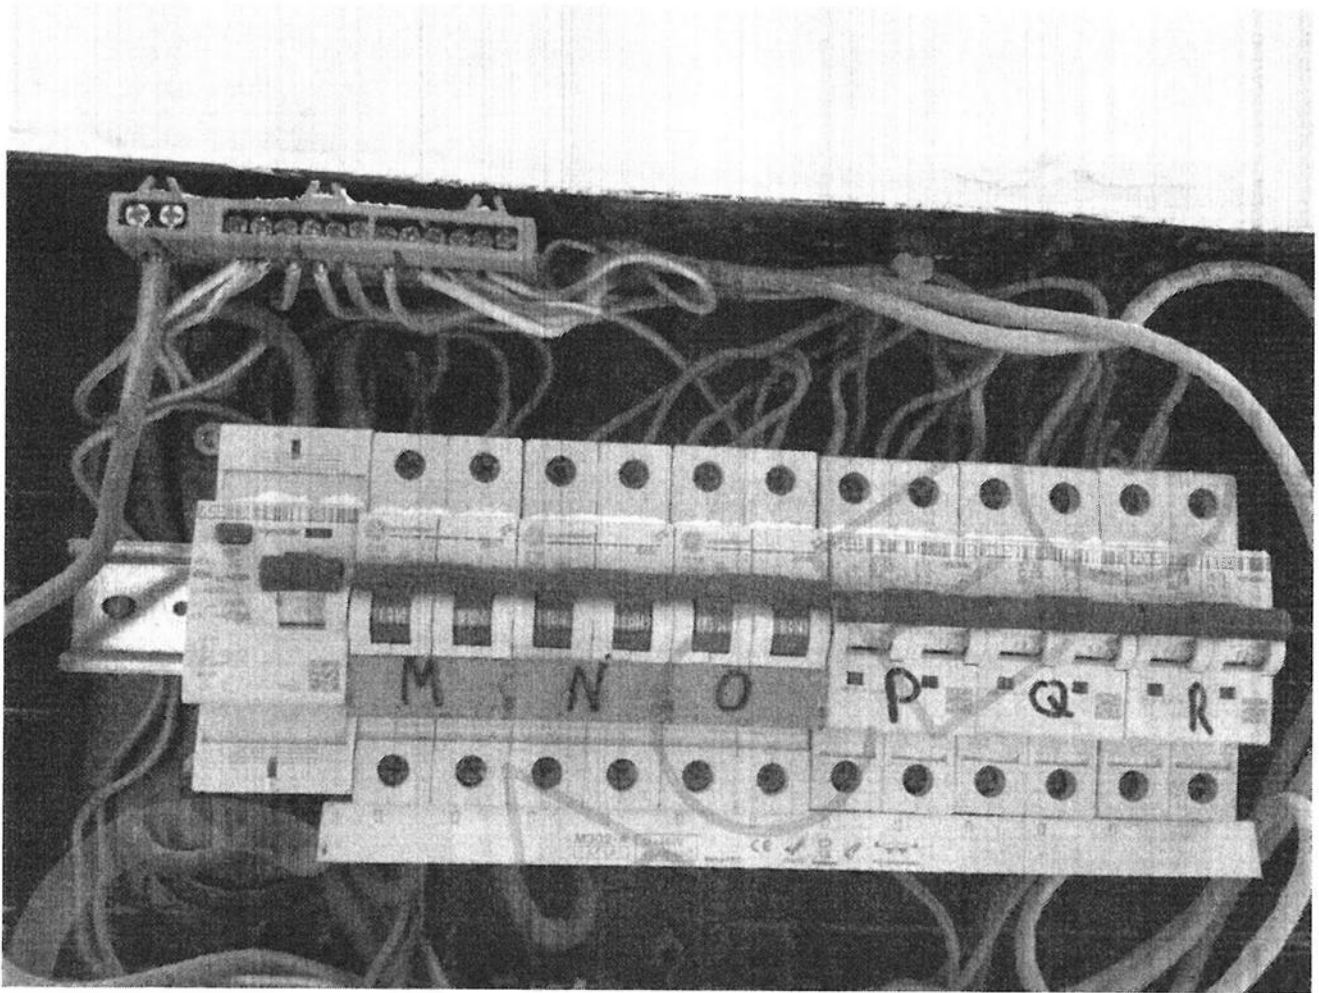

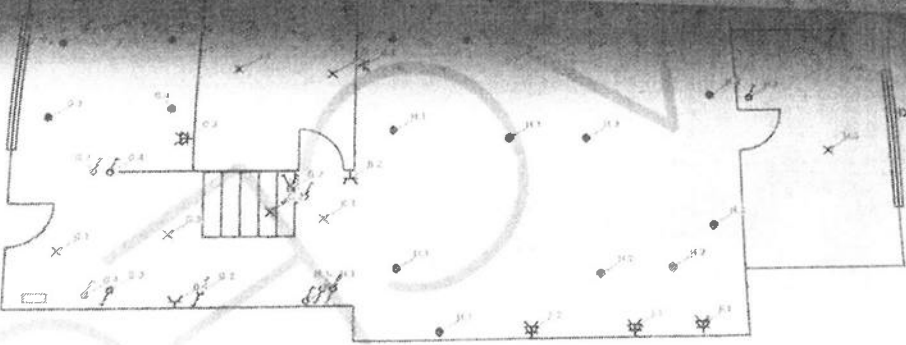

R	KEURING	KLANT	WERF	Spanning
ECOTHERM E0632725654 25 jan 2025	Organisatie <i>Mergen</i> ACEG Naam <i>311 N/Lo28</i> Datum Handtekening <i>[Signature]</i>	Naam Sukhwinder Toor Straat Kerkstraat 26 Gemeente Eeklo 9900 Handtekening	Naam Straat Gemeente Handtekening	2x240V 5/13 ll.

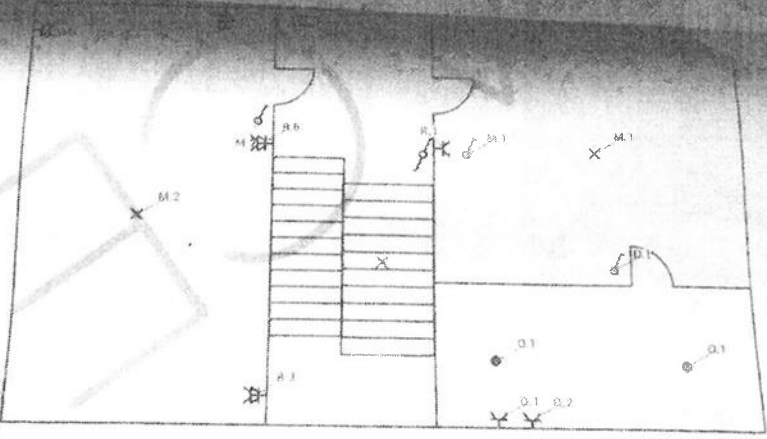

TALLATEUR	KEURING	KLANT	WERF	
ECOTHERM BE0632725654 25 jan 2025	Organisatie Naam Datum Handtekening	ACEG Naam Straat Gemeente Handtekening	Sukhwinder Toor Kerkstraat 28 Sektio 9900 Naam Straat Gemeente Handtekening	Spanning 2x240V

